

Voie Acces Centre Commercial Cantegril Commune de Saint-Sauveur

| Fonction | Intervenant | Adresse | Ville | Téléphone | Portable | E-mail | P | A | E | C |
|---------------------------------------|---|--|---------------------------|----------------|----------------|--|---|---|---|---|
| Maître d'Ouvrage | SARL GALTHIE SAINT SAUVEUR M. GALTHIE | 23 route d'Agde | 31000 TOULOUSE | 05.61.82.66.76 | 06.22.34.02.16 | pgalthie.amplitude@orpi.com | X | | | |
| Maître d'Ouvrage | SARL AGLA CARREFOUR CONTACT M. SOULAT | 130 rue Jacqueline de Romilly | 31790 SAINT SAUVEUR | | | Cedric.soulat34@gmail.com | X | | | |
| Maître d'œuvre VRD | G2 INGENIERIE Me BARREAU | 16 avenue Charles de Gaulle – bât 8 | 31130 BALMA | 05.34.27.62.20 | 06.72.84.57.34 | g2.chantier@orange.fr | X | | | |
| Mairie | MAIRIE ST-SAUVEUR M. BRACHET | Allée d'Orzalis | 31790 SAINT-SAUVEUR | 05.34.27.31.68 | | accueil@ville-saint-sauveur.fr | | | | |
| CD31 | CD 31 M. GALUPPO | | | | | eric.galuppo@cd31.fr | | | | |
| Communauté de communes du Frontonnais | CCF M. BETEILLE | 3 rue du Vigné | 31620 BOULOC | 05.61.82.13.32 | 06.75.30.85.68 | nicolas.beteille@cc-dufrontonnais.fr | | | | |
| Entreprises | COLAS M. DEBBAH | 101 rue de fenouillet BP 92004 | 31017 TOULOUSE CEDEX 2 | | 07.63.73.59.12 | Karim.debbah@colas.com | X | | | X |
| | SOTECFLU M. NAVARRO | 3 impasse de Gascogne – ZAC de l'Espèche | 31470 FONTENILLES | 05.62.48.71.71 | 06.18.13.66.40 | qn@sotecflu.com | X | | | |

(P) Présent (A) Absent (E) Excusé (C) Convoqué à la prochaine réunion

COMPTE RENDU DE CHANTIER DES TRAVAUX DE VRD

du **02/11/21**

N° **01**

| | | | |
|-------------|--|------------------|---|
| Intempéries | | Report | 0 |
| | | Dernière semaine | 0 |
| | | Cumulées | 0 |

Prochaine réunion de chantier le : Le Mardi 23 novembre 2021 à 11h00



16 avenue Charles de Gaulle - bâtiment n° 8
31130 BALMA
Tel : 05 34 27 62 20
Fax : 05 34 27 62 21
g2.toulouse@orange.fr

0 - GENERALITE

- Il est rappelé qu'aucun travail supplémentaire ne sera pris en compte et réglé par le Maître d'Ouvrage sans un accord écrit préalable de celui-ci,
- Sauf contestation formulée par écrit sous 8 jours, les indications portées à ce compte-rendu sont considérées comme définitives,
- Les entrepreneurs devront prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer :
 - la sécurité des personnes sur le chantier et sur ses abords,
 - la propreté permanente du chantier et sur ses abords,
 - le respect du travail réalisé,
- A toutes les entreprises : prendre vos précautions vis-à-vis des bardages des bâtiments lors des travaux à proximités et ne rien appuyer dessus.

1 - AVANCEMENT

- RAS

2 - PREVISIONS

COLAS

- Démarrage tvx : semaine 46
- Terrassements – empierrement : semaine 46-47
- Eaux pluviales : semaine 48
- Bordures et 0/20 : semaine 49-50
- BB : semaine 50
- Marquage : semaine 01

SOTECFLU

- Génie civil éclairage : semaine 49.
- Pose mâts d'éclairage : dès réception du matériel

3 - OBSERVATIONS


SARL GALTHIE

- Informe les entreprises et la MOE que les marchés seront montés avec 2 MOA et demande aux entreprises d'établir 2 devis :
 - o SARL GALTHIE SAINT SAUVEUR → 52% du marché
 - o SARL AGLA DISTRIB. → 48% du marché
- Demande une remise en état de l'espace vert comme vu en négociation. COLAS et G2 vérifierons si cela a été pris en compte.
 - o *Edit du 03/11 : Colas confirme que la remise en état est prévue mais que le ré-engazonnement de la zone n'a pas été pris en compte*
- Demande que l'accès chantier soit fait le plus rapidement possible depuis la RD pour préserver le parking.

COLAS

- L'accès depuis la RD devra être conforme aux prescriptions du CD 31 conformément à la permission de voirie accordée,

- Demande la permission d'annexer des places de stationnement pour son installation de chantier - demande validée par les MOA

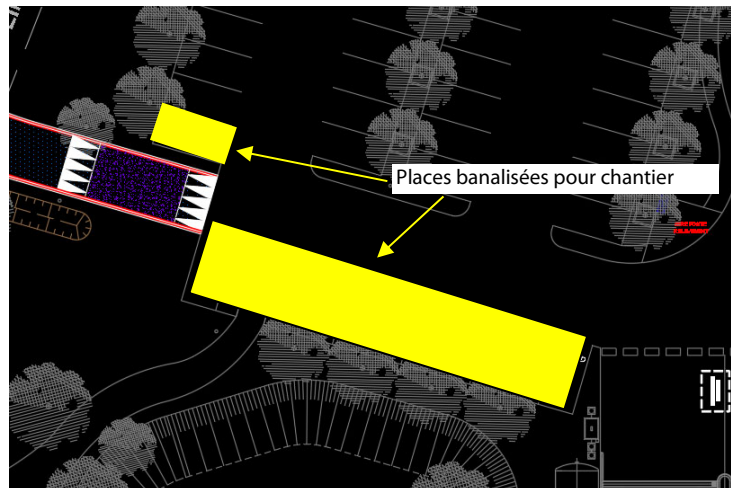

- Baliser les places de chantier concernées dès le 10/11 pour éviter les voitures tampons
- Colas signale prévoir un constat d'huissier avant travaux sur le parking existant

SOTECFLU

- Signale que le délai de livraison des candélabres est long (possible jusque 4 mois) : le fournisseur, contacté ce jour, annonce une livraison des mats pour la semaine 51.
- RAL des candélabres : 6022
- Etude d'éclairage faite et conforme PMR

G2

- Préparer les OS → En attente date exacte de démarrage
- Remonter les marchés avec les deux maitrises d'ouvrage
- Demande polygo au géomètre
- G2 enverra les fichiers DWG aux entreprises
- G2 transmettra la permission de voirie aux entreprises.

Prochaine réunion de chantier
Le mardi 23 Novembre à 11h00
